


INFORME DEL DESTINO DEL GASTO AL CUARTO TRIMESTRE 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FOLIO
2023	4	PUE230402256941	Proyecto de Inversión	1939422.56	[f1]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1939422.56, modificado:1939455.8]	PAYMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LAS CALLES 3 DE MAYO, CENTRAL Y 10 DE MAYO, EN LA COLONIA SANTA LUCIA, LOCALIDAD SANTA CLARA OCOYUCAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 205821	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ocoyucan	205821	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1711.7, meta_modificada:1711.7]}	1935455.8	1935455.8	1935455.8	1935455.8	1935455.8	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-019-A, contratista:MARIA ISABEL MARTINEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA, monto:1939422.56, importe_modificado:1935455.8]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1711.7]}	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402317187	Proyecto de Inversión	2713955.33	[f1]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2713955.33, modificado:2708400.46]	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO SAN HIPOLITO AGHAPÁ EMILIO PORTES GIL, 2DA ETAPA, DEL CADENAMIENTO O MAS 413.557 AL 1 MAS 021.5, EN LA LOCALIDAD DE SAN HIPOLITO AGHAPÁ, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 423516	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ocoyucan	423516	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3647.58, meta_modificada:3647.58]}	2708400.46	2708400.46	2708400.46	1381271.2	1381271.2	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-026-A, contratista:MAGUIRUBA JINCHERRA Y TERRACERAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA, monto:2713955.33, importe_modificado:2708400.46]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1900.0]}	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402320514	Proyecto de Inversión	79381.2	[f1]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79381.2, modificado:147525.66]	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CADENAMIENTO O MAS 297.31, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 437953	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ocoyucan	437953	{meta1: [unidad_medida:Metros, meta:298.0, meta_modificada:298.0]}	147525.66	147525.66	147525.66	0	0	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-037-A, contratista:CONSTRUCCIONES URBANPRO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA Nombre, denominación, monto:147525.66, importe_modificado:147525.66]}	{meta1: [unidad_medida:Metros, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402320879	Proyecto de Inversión	39669.44	[f1]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39669.44, modificado:33370.13]	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA PRIVADA BENITO JUAREZ ENTRE CALLE ATLÚXICO Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BERNABE TEMOXITLA, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 439408	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ocoyucan	439408	{meta1: [unidad_medida:Metros, meta:293.0, meta_modificada:293.0]}	33370.13	33370.13	33370.13	0	0	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-036-A, contratista:SUMINISTRO, PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN OJAF, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA, monto:33370.13, importe_modificado:33370.13]}	{meta1: [unidad_medida:Metros, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402320351	Proyecto de Inversión	2715705.63	[f1]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2715705.63, modificado:2715705.63]	AMPLIACIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, EN LA COLONIA TLACUÉL DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA LA ETAPA - 437466	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Municipio de Ocoyucan	437466	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:374.12, meta_modificada:374.12]}	2715705.63	2715705.63	2715705.63	2078455.14	2078455.14	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-028-A, contratista:MARIA ISABEL MARTINEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA, monto:2715705.63, importe_modificado:2715705.63]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0]}	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402321031	Proyecto de Inversión	941206.17	[f1]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941206.17, modificado:938066.7]	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DEL CAMINO SAN HIPOLITO AGHAPÁ A EMILIO PORTES GIL, DEL CADENAMIENTO 1MAS 021.5 A LA CARRETERA EMILIO PORTES GIL, EN LA LOCALIDAD DE SAN HIPOLITO AGHAPÁ, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 439551	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ocoyucan	439551	{meta1: [unidad_medida:Metros, meta:900.0, meta_modificada:900.0]}	938066.7	938066.7	938066.7	0	0	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP2023-039-A, contratista:ARQUITECTON-K INMOBILIARIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA, monto:938066.7, importe_modificado:938066.7]}	{meta1: [unidad_medida:Metros, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402320575	Proyecto de Inversión	1744471.31	[f1]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744471.31, modificado:1754525.47]	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CARRETERA PRINCIPAL EN EL TRAMO SANTA MARTHA A SANTA CLARA OCOYUCAN DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA HIDALGO, MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA - 438217	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ocoyucan	438217	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6193.0, meta_modificada:6193.0]}	1754525.47	1754525.47	1754525.47	1387599.55	1387599.55	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-033-A, contratista:HOMELANO AND POLITHAN CORPORATIVO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA, monto:1754525.47, importe_modificado:1754525.47]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4890.0]}	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402320989	Proyecto de Inversión	237346.41	[f1]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237346.41, modificado:234284.06]	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO, Y LÍMITE DE LA CALLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MALACATEPEC - 439569	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ocoyucan	439569	{meta1: [unidad_medida:Metros, meta:150.0, meta_modificada:150.0]}	234284.06	234284.06	234284.06	0	0	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-038-A, contratista:CONSTRUCCIONES URBANPRO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA, monto:234284.06, importe_modificado:234284.06]}	{meta1: [unidad_medida:Metros, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402321075	Proyecto de Inversión	232008.06	[f1]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232008.06, modificado:233388.91]	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA BUENAVISTA, ENTRE CALLE BUENAVISTA Y LÍMITE DE LA PRIVADA, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABE TEMOXITLA, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 440072	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ocoyucan	440072	{meta1: [unidad_medida:Metros, meta:235.0, meta_modificada:235.0]}	233388.91	233388.91	233388.91	0	0	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-034-A, contratista:CONSTRUCCIONES URBANPRO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA, monto:233388.91, importe_modificado:233388.91]}	{meta1: [unidad_medida:Metros, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402320187	Proyecto de Inversión	1565282.39	[f1]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565282.39, modificado:1565282.39]	PAYMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO JARAMOLA ENTRE CALLE AGUSTÍN PÉREZ Y CALLE FURBIDE EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 437307	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ocoyucan	437307	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0]}	1565282.39	1565282.39	1565282.39	1565919.55	1565919.55	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-029-A, contratista:CONSTRUCCIONES INARSOL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA, monto:1565282.39, importe_modificado:1565282.39]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0]}	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402321193	Proyecto de Inversión	755220.04	[f1]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755220.04, modificado:748771.84]	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABE TEMOXITLA, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 440572	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ocoyucan	440572	{meta1: [unidad_medida:Metros, meta:150.0, meta_modificada:150.0]}	748771.84	748771.84	748771.84	0	0	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-040-A, contratista:SUMINISTRO DE LA CONSTRUCCIÓN DE POP. S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA, monto:748771.84, importe_modificado:748771.84]}	{meta1: [unidad_medida:Metros, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402320454	Proyecto de Inversión	652601.15	[f1]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652601.15, modificado:652601.15]	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TELUCA Y PRIVADA TELUCA, ENTRE CALLE HESTIZINO Y CALLE 3 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA OCOYUCAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 437647	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ocoyucan	437647	{meta1: [unidad_medida:Metros, meta:614.0, meta_modificada:614.0]}	652601.15	652601.15	652601.15	513498.04	513498.04	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-031-A, contratista:JORGE GARCIA CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA, monto:652601.15, importe_modificado:652601.15]}	{meta1: [unidad_medida:Metros, avance:500.0]}	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402320761	Proyecto de Inversión	871789.78	[f1]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871789.78, modificado:927266.54]	PAYMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA SEGUNDA PRIVADA AGUSTIN PÉREZ, ENTRE CALLE AGUSTÍN PÉREZ Y LÍMITE DE LA PRIVADA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 438965	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ocoyucan	438965	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:454.85, meta_modificada:454.85]}	927266.54	927266.54	927266.54	0	0	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-035-A, contratista:CONSTRUCCIONES INARSOL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA, monto:871789.78, importe_modificado:927266.54]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:454.85]}	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230202227576	Proyecto de Inversión	280408.43	[f1]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280408.43, modificado:3203958.47]	PAYMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE CHOUUA, ENTRE CALLE BARBACUJA Y CALLE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA OCOYUCAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 109405	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ocoyucan	104045	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3115.0, meta_modificada:3115.0]}	3203958.47	3203958.47	3203958.47	3203958.47	3203958.47	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-003-A, contratista:CONSTRUCCIONES URBANO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, monto:280408.43, importe_modificado:3203958.47]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3549.0]}	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230302256248	Proyecto de Inversión	2604041.32	[f1]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2604041.32, modificado:2604041.32]	PAYMENTACIÓN CON ADOQUÍN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE REFORMA Y DOLORÉS, ENTRE CALLE HÍDALGO Y CALLE JAGLUEY, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA OCOYUCAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 200891	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ocoyucan	200891	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1856.0, meta_modificada:1856.0]}	2604041.32	2604041.32	2604041.32	2604041.32	2604041.32	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-009-A, contratista:HELOA RAMÍREZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA, monto:2604041.32, importe_modificado:2604041.32]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1856.0]}	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402315079	Proyecto de Inversión	499470.84	[f1]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499470.84, modificado:499470.84]	PAYMENTACIÓN CON ADOQUIN DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y ALCANTARILLO DE SALUD, EN LA LOCALIDAD SAN BERNABE TEMOXITLA - 414758	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ocoyucan	414758	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.82, meta_modificada:256.82]}	499470.84	499470.84	499470.84	499470.84	499470.84	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-022-A, contratista:PLANEACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ROSENTH, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA, monto:499470.84, importe_modificado:499470.84]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.82]}	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402315400	Proyecto de Inversión	767796.03	[f1]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767796.03, modificado:767796.03]	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE ALLENDE, ENTRE CALLE CRISTO REY Y CALLE ALLENDE, DE LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 418359	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ocoyucan	418359	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:306.36, meta_modificada:306.36]}	767796.03	767796.03	767796.03	767796.03	767796.03	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-024-A, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA MOONRIANA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA, monto:767796.03, importe_modificado:767796.03]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:306.36]}	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402315668	Proyecto de Inversión	719026.1	[f1]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719026.1, modificado:719026.1]	PAYMENTACIÓN CON ADOCRETO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE INTERPATIA EN LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE INTERPATIA Y CALLE RESPONDENCIA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 416993	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ocoyucan	416993	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:603.53, meta_modificada:603.53]}	719026.1	719026.1	719026.1	719026.1	719026.1	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-025-A, contratista:HELOA RAMÍREZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA, monto:719026.1, importe_modificado:719026.1]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:603.53]}	Terminado	Validado avances



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBLAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2023	4	PUE230302256709	Proyecto de inversión	481573.62	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481573.62, modificado:481573.62}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE LA PRIVADA ZARAGOZA ENTRE LA CALLE ZARAGOZA Y BARRANCA, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, MUNICIPIO DE OCCUYUCAN, PUEBLA - 204109	Ocuyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ocuyucan	204109	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.25, meta_modificada:145.25}}	481573.62	481573.62	481573.62	481573.62	481573.62	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-016-A, contratista:EDUARDO TOMACATL COCOTI, convocante:MUNICIPIO DE OCCUYUCAN, PUEBLA, monto:481573.62, importe_modificado:481573.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.25}}	Terminado	Validado avances	
2023	4	PUE23040217441	Proyecto de inversión	539037.06	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539037.06, modificado:539037.06}}	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PRIVADA ATILCO 2 ENTRE CALLE ATILCO Y LÍMITE DE LA PRIVADA, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCCUYUCAN, PUEBLA - 428497	Ocuyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ocuyucan	428497	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:326.64, meta_modificada:326.64}}	539037.06	539037.06	539037.06	539037.06	539037.06	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-027-A, contratista:HOMELAND & POUTHAM CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCCUYUCAN, PUEBLA, monto:539037.06, importe_modificado:539037.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:326.64}}	Terminado	Validado avances	
2023	4	PUE230202228417	Proyecto de inversión	1334015.32	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1334015.32, modificado:1334015.32}}	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACCESO PRINCIPAL A LA PASTORÍA SANTA LUCÍA DEL CADENAMIENTO D MAS 543.93 AL 0 MAS 823.93, DE LA LOCALIDAD DE LA PASTORÍA, DEL MUNICIPIO DE OCCUYUCAN, PUEBLA - 111294	Ocuyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ocuyucan	111294	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}}	1334015.32	1334015.32	1334015.32	1334015.32	1334015.32	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-006-A, contratista:HOMELAND AND POUTHAM CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCCUYUCAN, PUEBLA, monto:1334015.32, importe_modificado:1334015.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1920.0}}	Terminado	Validado avances	
2023	4	PUE230302256501	Proyecto de inversión	2333089.86	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2333089.86, modificado:2333089.86}}	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALAMOS ENTRE LÍMITE DE LA CALLE Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCCUYUCAN, PUEBLA - 202657	Ocuyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ocuyucan	202657	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:769.12, meta_modificada:769.12}}	2333089.86	2333089.86	2333089.86	2333089.86	2333089.86	2333089.86	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-014-A, contratista:FABRICADOS Y MATERIALES MOCE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCCUYUCAN, PUEBLA, monto:2333089.86, importe_modificado:2333089.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:769.12}}	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230302256776	Proyecto de inversión	1462057.4	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462057.4, modificado:1462057.4}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO PUENTE DE LA AUTOPISTA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA HIDALGO, MUNICIPIO DE OCCUYUCAN PUEBLA - 204549	Ocuyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ocuyucan	204549	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1334.6, meta_modificada:1334.6}}	1462057.4	1462057.4	1462057.4	1462057.4	1462057.4	1462057.4	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-017-A, contratista:PLANEACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ROSEVEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCCUYUCAN, PUEBLA, monto:1462057.4, importe_modificado:1462057.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1334.6}}	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402312151	Proyecto de inversión	704082.43	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704082.43, modificado:704082.43}}	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA MORELOS ENTRONQUE CON CALLE MORELOS UBICADA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA MALACATEPEC MUNICIPIO DE OCCUYUCAN - 440872	Ocuyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ocuyucan	440872	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:349.13, meta_modificada:349.13}}	704082.43	704082.43	704082.43	704082.43	704082.43	704082.43	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-032-A, contratista:SUMINISTRO, PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DAFSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCCUYUCAN, PUEBLA, monto:704082.43, importe_modificado:704082.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:349.13}}	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230302256999	Proyecto de inversión	2884082.91	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2884082.91, modificado:2884082.91}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA TLACALEL DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCCUYUCAN, PUEBLA - 201993	Ocuyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ocuyucan	201993	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1363.1, meta_modificada:1363.1}}	2884082.91	2884082.91	2884082.91	2884082.91	2884082.91	2884082.91	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-011-A, contratista:MARIA ISABEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCCUYUCAN, PUEBLA, monto:2884082.91, importe_modificado:2884082.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1363.1}}	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230302256478	Proyecto de inversión	120946.2	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120946.2, modificado:1344535.67}}	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ATZINGO Y PRIVADA ATZINGO, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORILOS, UBICADA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCCUYUCAN, PUEBLA - 202202	Ocuyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ocuyucan	202202	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1141.5, meta_modificada:1141.5}}	1344535.67	1344535.67	1344535.67	1344535.67	1344535.67	1344535.67	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-012-A, contratista:JORGE RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCCUYUCAN, PUEBLA, monto:120946.2, importe_modificado:1344535.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1141.5}}	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230302256850	Proyecto de inversión	1048157.56	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048157.56, modificado:1048157.56}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ITURBIDE ENTRE LA CALLE AGUSTÍN PEÑEZ Y CALLE ZARAGOZA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, MUNICIPIO DE OCCUYUCAN, PUEBLA - 209056	Ocuyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ocuyucan	209056	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}}	1048157.56	1048157.56	1048157.56	1048157.56	1048157.56	1048157.56	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-018-A, contratista:CONSTRUCCIONES MARSON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCCUYUCAN, PUEBLA, monto:1048157.56, importe_modificado:1048157.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}}	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402151539	Proyecto de inversión	705029.81	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705029.81, modificado:705029.81}}	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE 8 DE MARZO SEGUNDA ETAPA, ENTRE CALLE LIBERTAD Y LÍMITE DE LA CALLE, EN LA COLONIA CRISTINA ROSAS ILESCAS DE LA LOCALIDAD SANTA CLARA OCCUYUCAN, MUNICIPIO DE OCCUYUCAN, PUEBLA - 415793	Ocuyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ocuyucan	415793	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:589.07, meta_modificada:589.07}}	705029.81	705029.81	705029.81	705029.81	705029.81	705029.81	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-023-A, contratista:MARIA ISABEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCCUYUCAN, PUEBLA, monto:705029.81, importe_modificado:705029.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:589.07}}	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230302256655	Proyecto de inversión	378385.46	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378385.46, modificado:414217.79}}	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA MANZANILLO 1, ENTRE CALLE AZUMATLA Y LÍMITE DE LA PRIVADA, UBICADA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCCUYUCAN, PUEBLA - 203784	Ocuyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ocuyucan	203784	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.43, meta_modificada:276.43}}	414217.79	414217.79	414217.79	414217.79	414217.79	414217.79	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-015-A, contratista:BEATRIZ TOCHIHUITI PASTRANA, convocante:MUNICIPIO DE OCCUYUCAN, PUEBLA, monto:414217.79, importe_modificado:414217.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.43}}	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230302256886	Proyecto de inversión	1010005.4	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010005.4, modificado:1115292.74}}	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DURAZNÓTLA, ENTRE CALLE BENTO JUAREZ Y CADENAMIENTO D MAS 850.00, DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA OCCUYUCAN, MUNICIPIO DE OCCUYUCAN, PUEBLA - 206000	Ocuyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ocuyucan	206000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1019.0, meta_modificada:1040.0}}	1115292.74	1115292.74	1115292.74	1115292.74	1115292.74	1115292.74	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-020-A, contratista:GRUPO URBANIZADOR AN CODING SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OCCUYUCAN, PUEBLA, monto:1010005.4, importe_modificado:1115292.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1040.0}}	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402120651	Proyecto de inversión	1314360.06	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314360.06, modificado:1314360.06}}	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE DE LA LUZ Y CALLE MORELOS, ENTRE CALLE ATZINGO Y PANTEÓN, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCCUYUCAN, PUEBLA - 438514	Ocuyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ocuyucan	438514	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:679.0, meta_modificada:679.0}}	1314360.06	1314360.06	1314360.06	1314360.06	1314360.06	1314360.06	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-030-A, contratista:BEATRIZ TOCHIHUITI PASTRANA, convocante:MUNICIPIO DE OCCUYUCAN, PUEBLA, monto:1314360.06, importe_modificado:1314360.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:679.0}}	Terminado	Validado avances

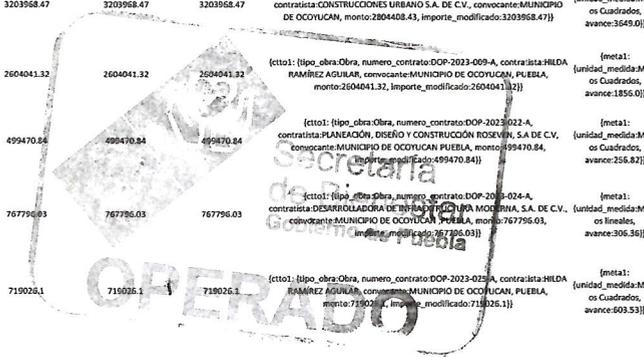
